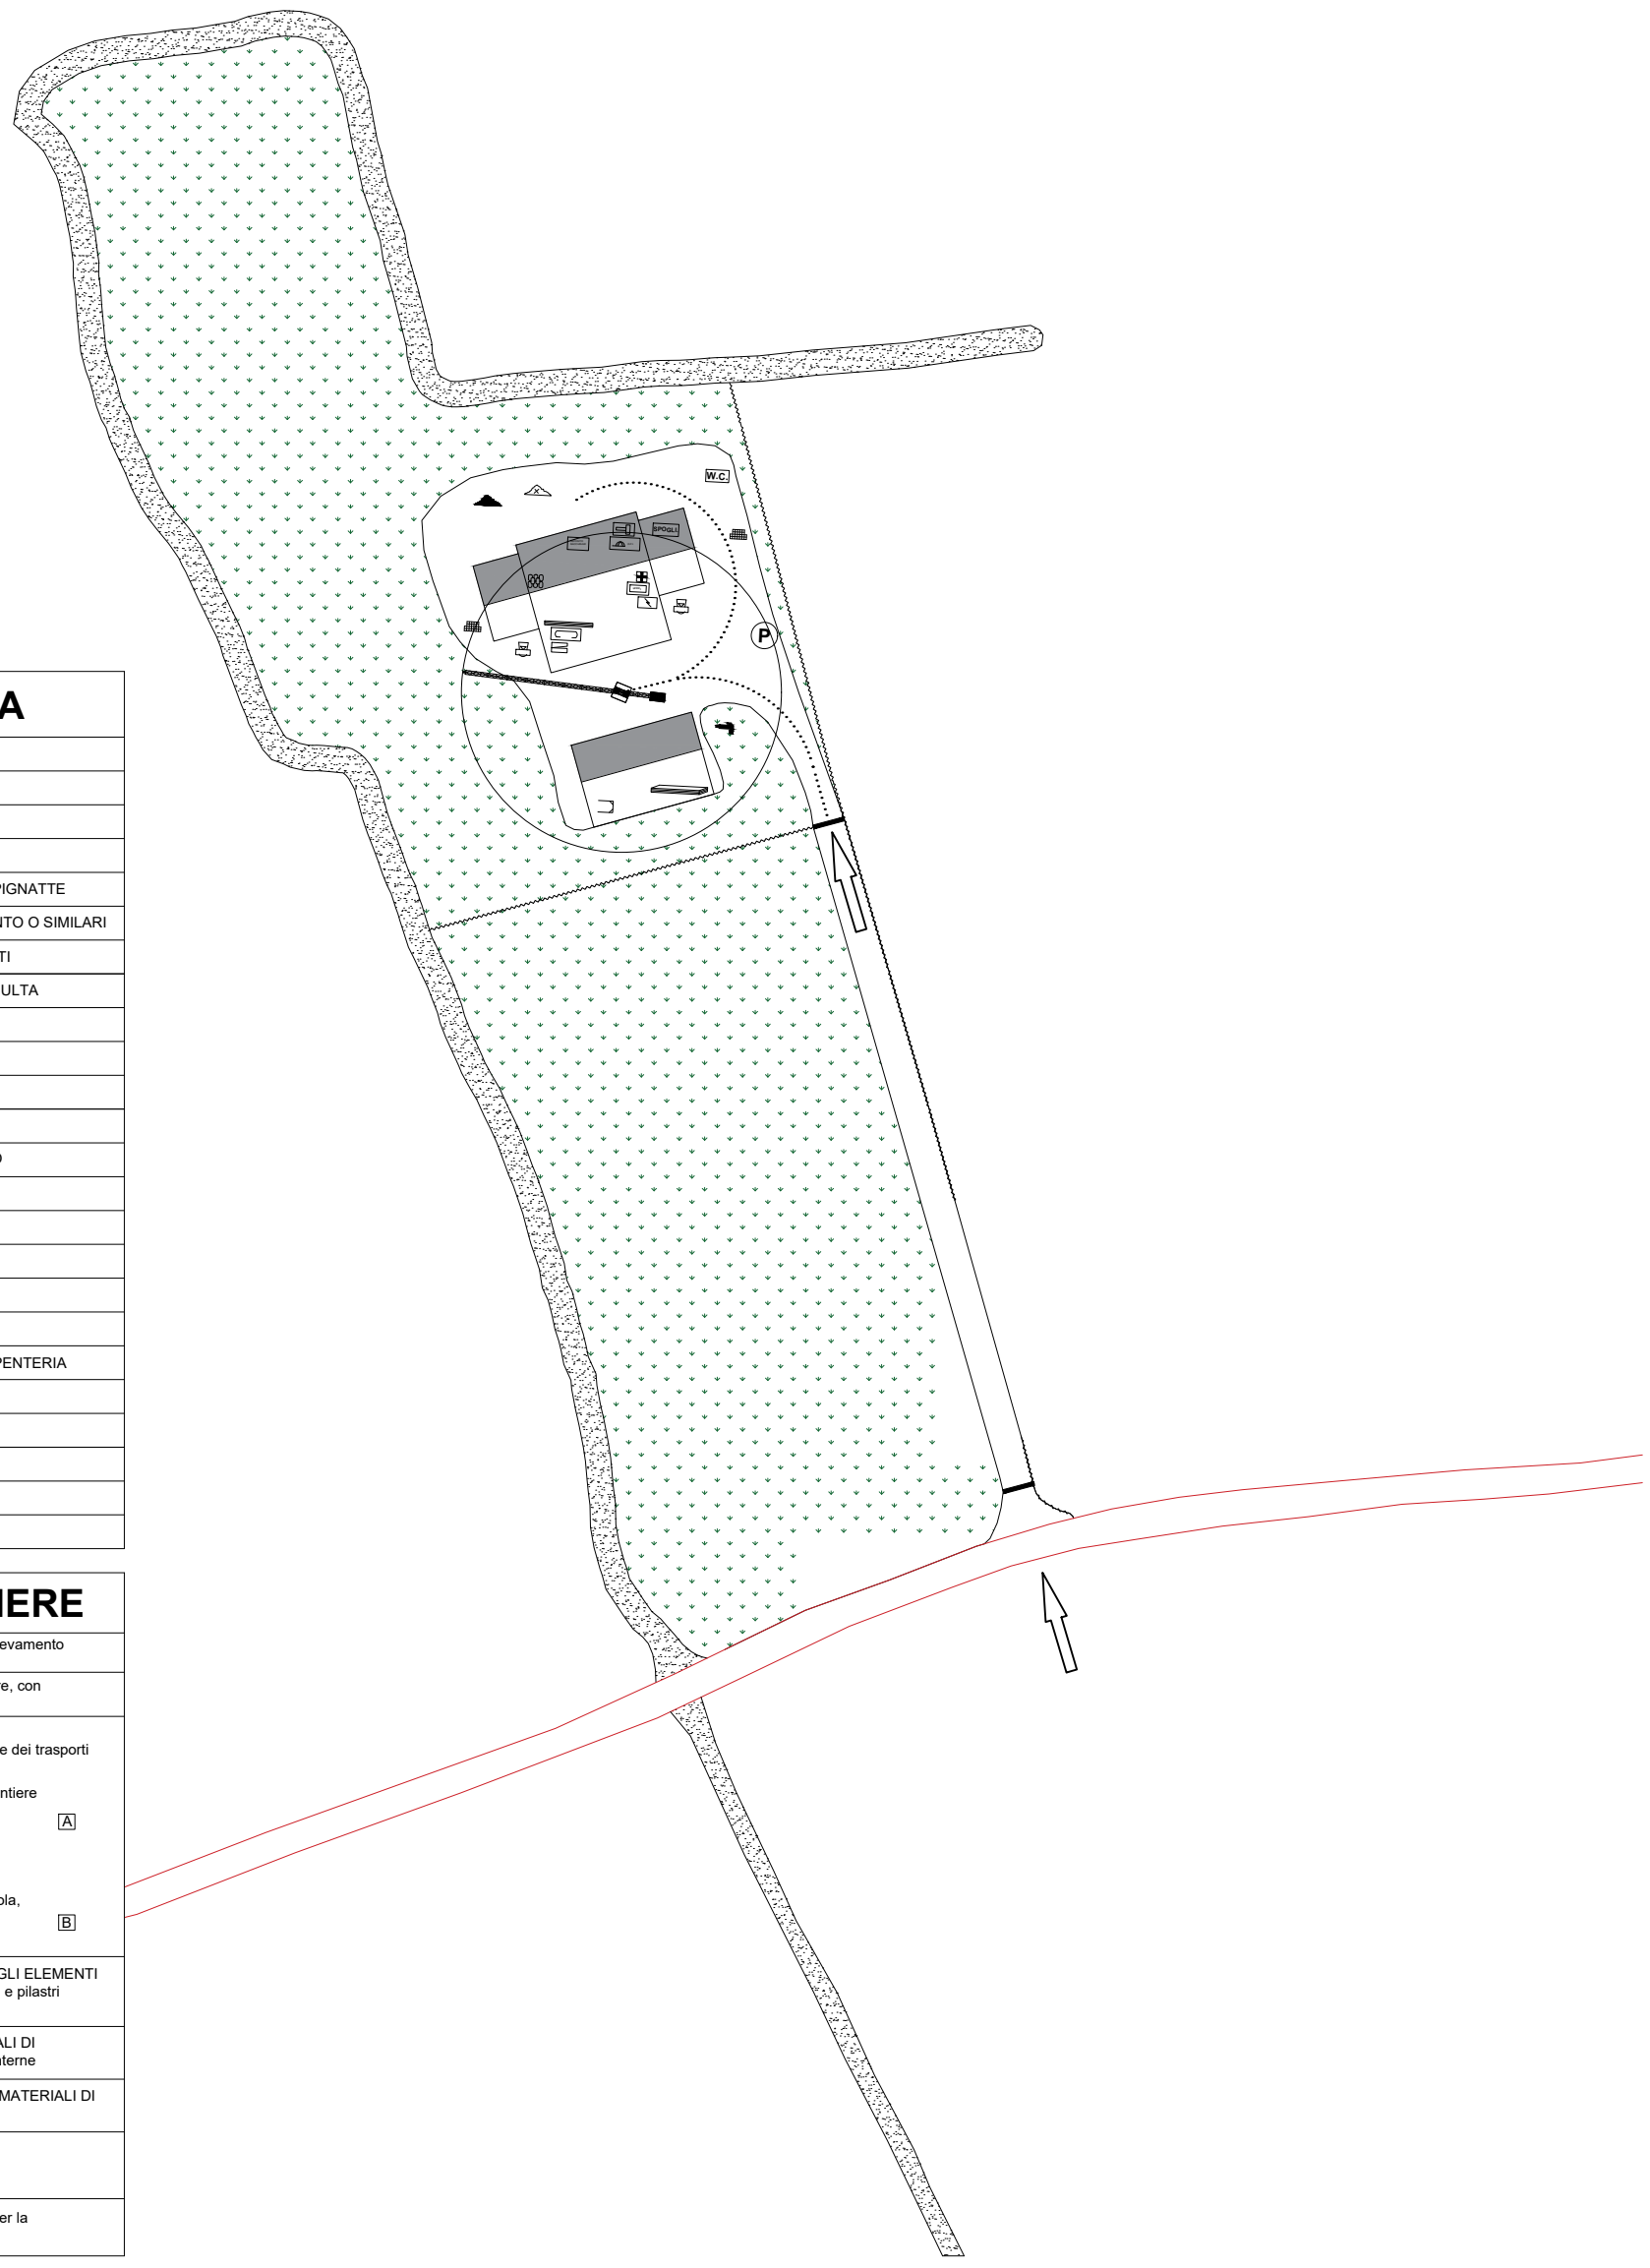


L E G E N D A

	RECINZIONE
P	PARCHEGGIO
	ACCESSO PEDONALE
	ACCESSO MEZZI
	STOCCAGGIO LATERIZI, SOLAI PIGNATTE
	STOCCAGGIO SACCHI DI CEMENTO O SIMILARI
	STOCCAGGIO MATERIALI SCIOLTI
	STOCCAGGIO MATERIALI DI RISULTA
	BETONIERA
	BANCO FERRAIOLI
	CESOIA
UFFICI	UFFICI
	CASSETTA PRONTO SOCCORSO
	DEPOSITO PONTEGGI
DEPOSITO MACCHINARI	DEPOSITO MACCHINARI
	DEPOSITO ATTREZZATURE
D.P.I.	DEPOSITO D.P.I.
	STOCCAGGIO LEGNAME
	STOCCAGGIO FERRO PER CARPENTERIA
	PERCORSO MEZZI
	PONTEGGIO
	QUADRO PRINCIPALE
	UTILIZZATORI LINEA IDRICA
W.C. SPOGLI	SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI

DOTAZIONE CANTIERE

AUTOGRU – gru mobile su gomma, impiegata per il sollevamento e il posizionamento degli elementi prefabbricati

RECINZIONE – H 2,00 m – perimetro dell'area di cantiere, con accesso controllato

ACCESSI n° 2, di cui:
- n°1 CARRABILE – per l'ingresso dei mezzi pesanti e dei trasporti eccezionali con gli elementi prefabbricati
- n°1 PEDONALE – per l'accesso del personale di cantiere

BARACCHE n° 2

LOCABOX – ufficio di cantiere / direzione lavori, dotazione: WC + Pronto Soccorso — A

LOCABOX – ufficio dell'impresa esecutrice / guardiola, dotazione: WC — B

AREA DESTINATA AL DEPOSITO TEMPORANEO DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI: pannelli di tamponamento, solai, travi e pilastri posizionati su terra battuta in attesa del montaggio

AREA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DEI MATERIALI DI FINITURA: laterizi, tegole e materiali per le lavorazioni interne

AREA DESTINATA ALLO STOCCAGGIO DI RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA

POSTAZIONI DI LAVORO FISSE n° 2, di cui:
n°1 PREPARAZIONE MALTA / CLS
n°1 LAVORAZIONE FERRO IN BARRE

VIABILITÀ INTERNA – percorso in terra battuta/ghiaia per la movimentazione dei mezzi e dell'autogru
